

閲覧用

都市再生整備計画 事後評価シート  
東鷲宮駅周辺地区

令和5年3月


埼玉県 久喜市



## 様式2-2 地区の概要

東鷲宮駅周辺地区(埼玉県久喜市) 都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
大目標: 人にやさしく健康的で住みやすいまち 目標: ユニバーサルデザインのまちづくり	駅東西間の移動に要する時間	単位: 分	5	H30	3	H34	2.08	R4
	周辺住民の不満足度	単位: %	40	H30	20	H34	2.8	R4

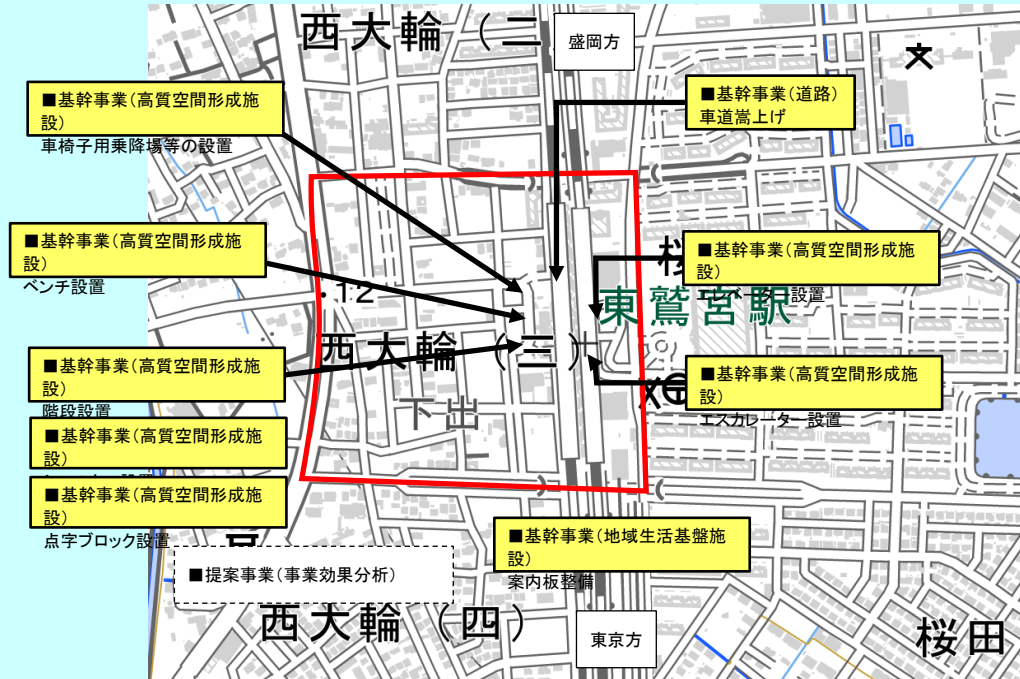

凡例	
<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span>	基幹事業
<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span>	提案事業

まちの課題の変化	・東鷲宮駅西口側にエスカレーターとエレベーターが設置されたことで、バリアフリー構造が向上した。
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	・東鷲宮駅東西連絡地下道及び西口駅前広場の整備により利便性・快適性が向上し、駅の利用率が高まっている。駅周辺における回遊空間の創出を目的に、立体通路の整備としてペDESTリアンデッキ、シェルターを設置する。
